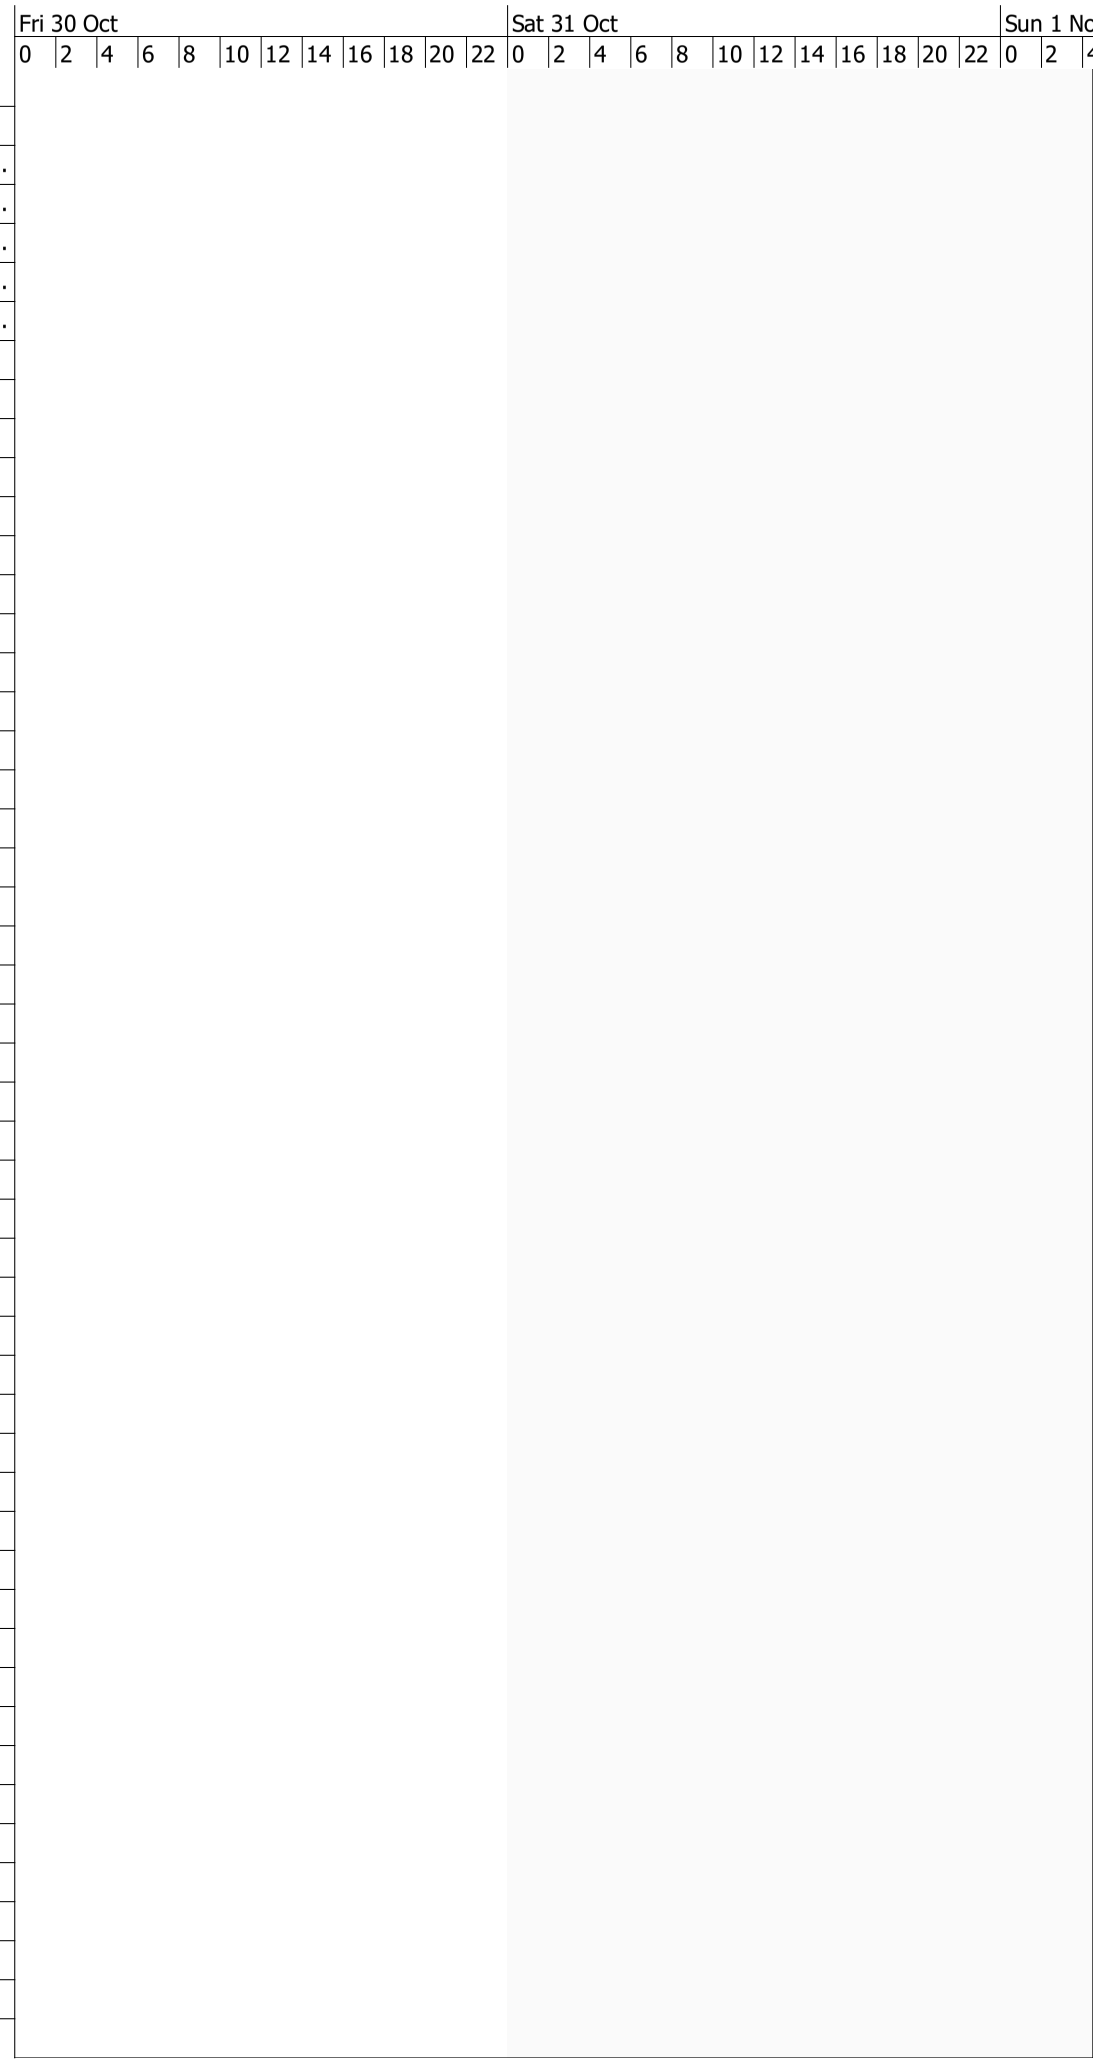
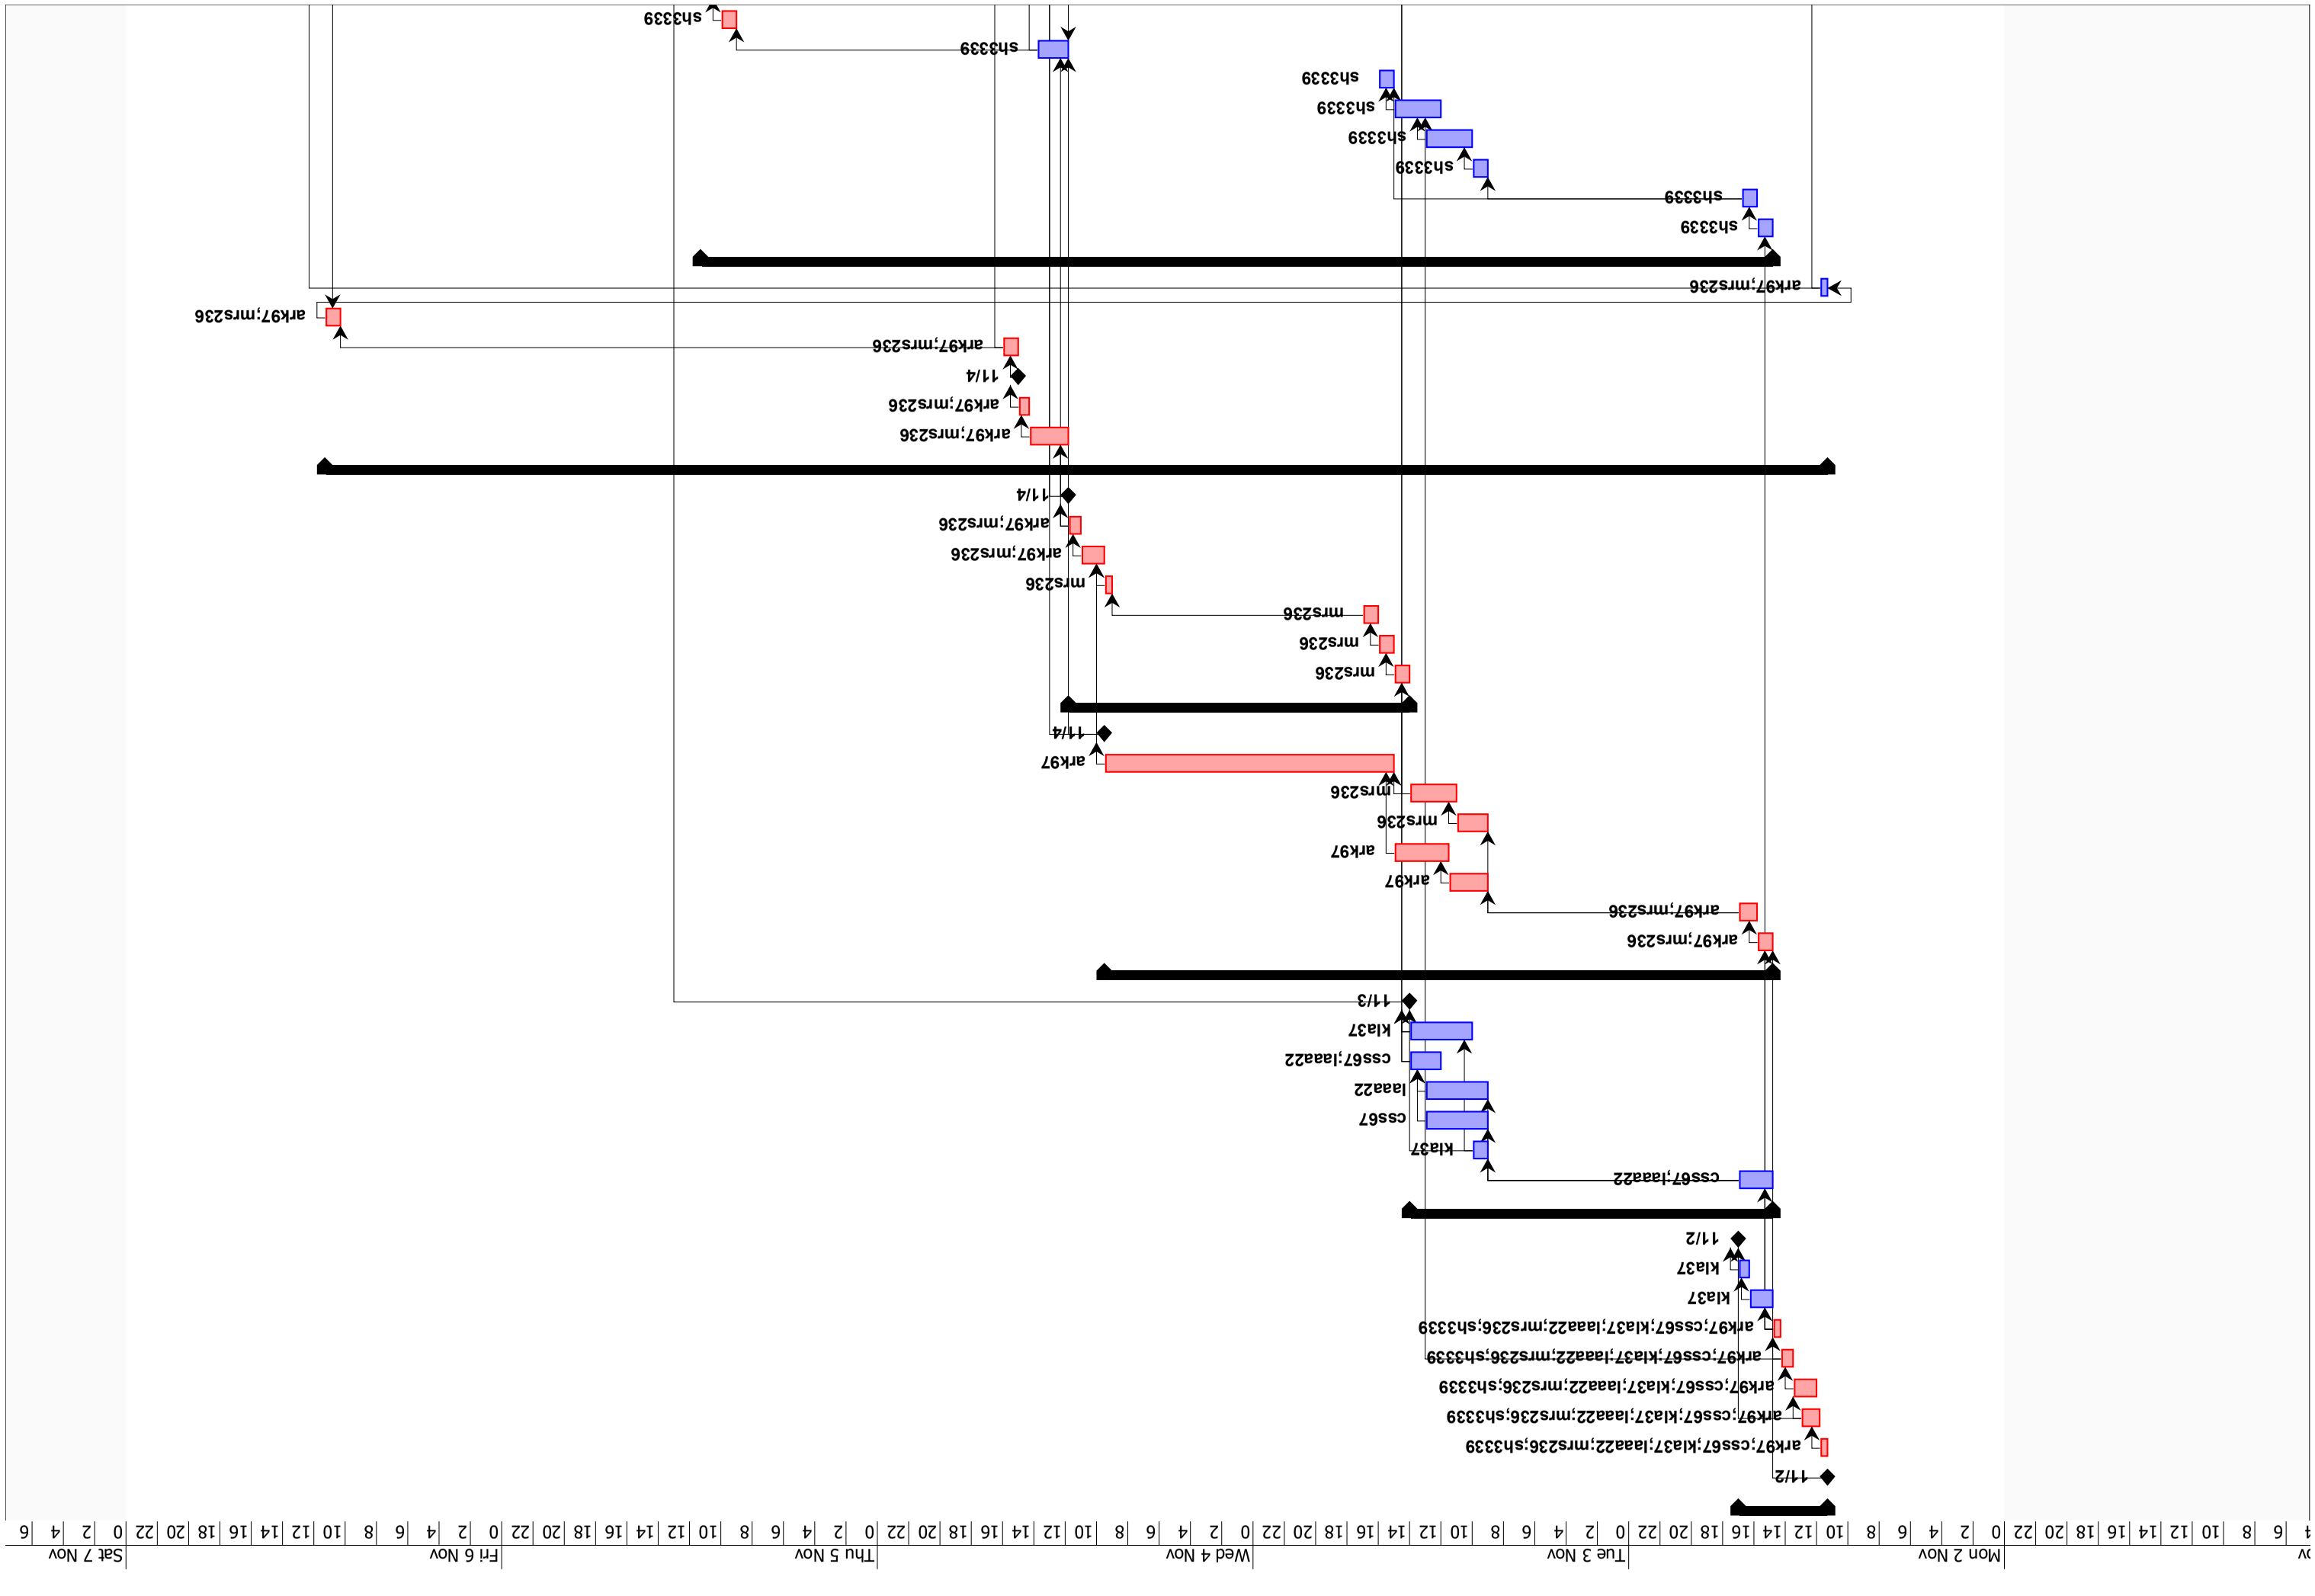
		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		**WP1 Project managem...**	**0.594 days**	**11/2/26, 11:15 AM**	**11/2/26, 5:00 PM**		
2		Kit handout	0 days	11/2/26, 11:15 AM	11/2/26, 11:15 AM		
3		Team charter agreed an...	0.062 days	11/2/26, 11:15 AM	11/2/26, 11:45 AM		ark97;css67;kla37;laaa22;m...
4		Skillsmatrix	0.031 days	11/2/26, 11:45 AM	11/2/26, 1:00 PM	3	ark97;css67;kla37;laaa22;m...
5		Aims, scope and objectives	0.062 days	11/2/26, 1:00 PM	11/2/26, 1:30 PM	4	ark97;css67;kla37;laaa22;m...
6		Work packages and task...	0.094 days	11/2/26, 1:30 PM	11/2/26, 2:15 PM	5	ark97;css67;kla37;laaa22;m...
7		Independent PERT durat...	0.062 days	11/2/26, 2:15 PM	11/2/26, 2:45 PM	6	ark97;css67;kla37;laaa22;m...
8		Build Gantt chart and crit...	0.188 days	11/2/26, 2:45 PM	11/2/26, 4:15 PM	7	kla37
9		Scheduling risk register (...	0.094 days	11/2/26, 4:15 PM	11/2/26, 5:00 PM	8	kla37
10		Planningcomplete	0 days	11/2/26, 5:00 PM	11/2/26, 5:00 PM	4;9	
11		**WP2 Research**	**0.781 days**	**11/2/26, 2:45 PM**	**11/3/26, 2:00 PM**		
12		Semiconductors and dopi...	0.281 days	11/2/26, 2:45 PM	11/2/26, 5:00 PM	7	css67;laaa22
13		PN junctions and biasing ...	0.125 days	11/3/26, 9:00 AM	11/3/26, 10:00 AM	12	kla37
14		BJT structure and opera...	0.375 days	11/3/26, 9:00 AM	11/3/26, 1:00 PM	12	css67
15		MOSFET structure and o...	0.375 days	11/3/26, 9:00 AM	11/3/26, 1:00 PM	12	laaa22
16		BJT vs MOSFET comparison	0.125 days	11/3/26, 1:00 PM	11/3/26, 2:00 PM	14;15	css67;laaa22
17		Circular economy resear...	0.375 days	11/3/26, 10:00 AM	11/3/26, 2:00 PM	13	kla37
18		Research complete	0 days	11/3/26, 2:00 PM	11/3/26, 2:00 PM	16;13;17	
19		**WP3 Transistor charac...**	**1.219 days**	**11/2/26, 2:45 PM**	**11/4/26, 9:30 AM**		
20		Check datasheets and pi...	0.125 days	11/2/26, 2:45 PM	11/2/26, 3:45 PM	2;7	ark97;mrs236
21		Set up bench and check ...	0.156 days	11/2/26, 3:45 PM	11/2/26, 5:00 PM	20	ark97;mrs236
22		BJT input characteristics	0.312 days	11/3/26, 9:00 AM	11/3/26, 11:30 AM	21	ark97
23		BJT output characteristics	0.312 days	11/3/26, 11:30 AM	11/3/26, 3:00 PM	22	ark97
24		MOSFET drain characteri...	0.25 days	11/3/26, 9:00 AM	11/3/26, 11:00 AM	21	mrs236
25		MOSFET transfer charac...	0.25 days	11/3/26, 11:00 AM	11/3/26, 2:00 PM	24	mrs236
26		Plot graphs, on/off ratio ...	0.312 days	11/3/26, 3:00 PM	11/4/26, 9:30 AM	23;25	ark97
27		Characterisation complete	0 days	11/4/26, 9:30 AM	11/4/26, 9:30 AM	26	
28		**WP4 Logic gates**	**0.719 days**	**11/3/26, 2:00 PM**	**11/4/26, 11:45 AM**		
29		Build and test NOT gate	0.125 days	11/3/26, 2:00 PM	11/3/26, 3:00 PM	25	mrs236
30		Build and test AND gate	0.125 days	11/3/26, 3:00 PM	11/3/26, 4:00 PM	29	mrs236
31		Build and test OR gate	0.125 days	11/3/26, 4:00 PM	11/3/26, 5:00 PM	30	mrs236
32		Chain gates (3-input AND)	0.062 days	11/4/26, 9:00 AM	11/4/26, 9:30 AM	31	mrs236
33		Build and test XOR gate	0.188 days	11/4/26, 9:30 AM	11/4/26, 11:00 AM	32;26	ark97;mrs236
34		Record truth tables and ...	0.094 days	11/4/26, 11:00 AM	11/4/26, 11:45 AM	33	ark97;mrs236
35		Logic gates verified	0 days	11/4/26, 11:45 AM	11/4/26, 11:45 AM	34	
36		**WP5 Digital system**	**3.5 days**	**11/2/26, 11:15 AM**	**11/6/26, 11:15 AM**		
37		Build half adder	0.188 days	11/4/26, 11:45 AM	11/4/26, 2:15 PM	34	ark97;mrs236
38		Test half adder against t...	0.094 days	11/4/26, 2:15 PM	11/4/26, 3:00 PM	37	ark97;mrs236
39		Half adder working	0 days	11/4/26, 3:00 PM	11/4/26, 3:00 PM	38	
40		Buffer: half adder fixes	0.125 days	11/4/26, 3:00 PM	11/4/26, 4:00 PM	39	ark97;mrs236
41		Full adder challenge with...	0.125 days	11/6/26, 10:15 AM	11/6/26, 11:15 AM	40;67	ark97;mrs236
42		Chain full adders	0.062 days	11/2/26, 11:15 AM	11/2/26, 11:45 AM	41	ark97;mrs236
43		**WP6 Quality managem...**	**2.312 days**	**11/2/26, 2:45 PM**	**11/5/26, 11:15 AM**		
44		Set up QMS folder tree	0.125 days	11/2/26, 2:45 PM	11/2/26, 3:45 PM	7	sh3339
45		File naming procedure	0.125 days	11/2/26, 3:45 PM	11/2/26, 4:45 PM	44	sh3339
46		Quality manual	0.125 days	11/3/26, 9:00 AM	11/3/26, 10:00 AM	45	sh3339
47		GitHub repo, branch and...	0.25 days	11/3/26, 10:00 AM	11/3/26, 1:00 PM	46	sh3339
48		Traceability matrix (to v...	0.25 days	11/3/26, 1:00 PM	11/3/26, 3:00 PM	6;47	sh3339
49		Documents gallery sprea...	0.125 days	11/3/26, 3:00 PM	11/3/26, 4:00 PM	45;48	sh3339
50		File lab records and resul...	0.125 days	11/4/26, 11:45 AM	11/4/26, 1:45 PM	57;27;35	sh3339
51		Finalise QMS and update...	0.125 days	11/5/26, 9:00 AM	11/5/26, 10:00 AM	50	sh3339

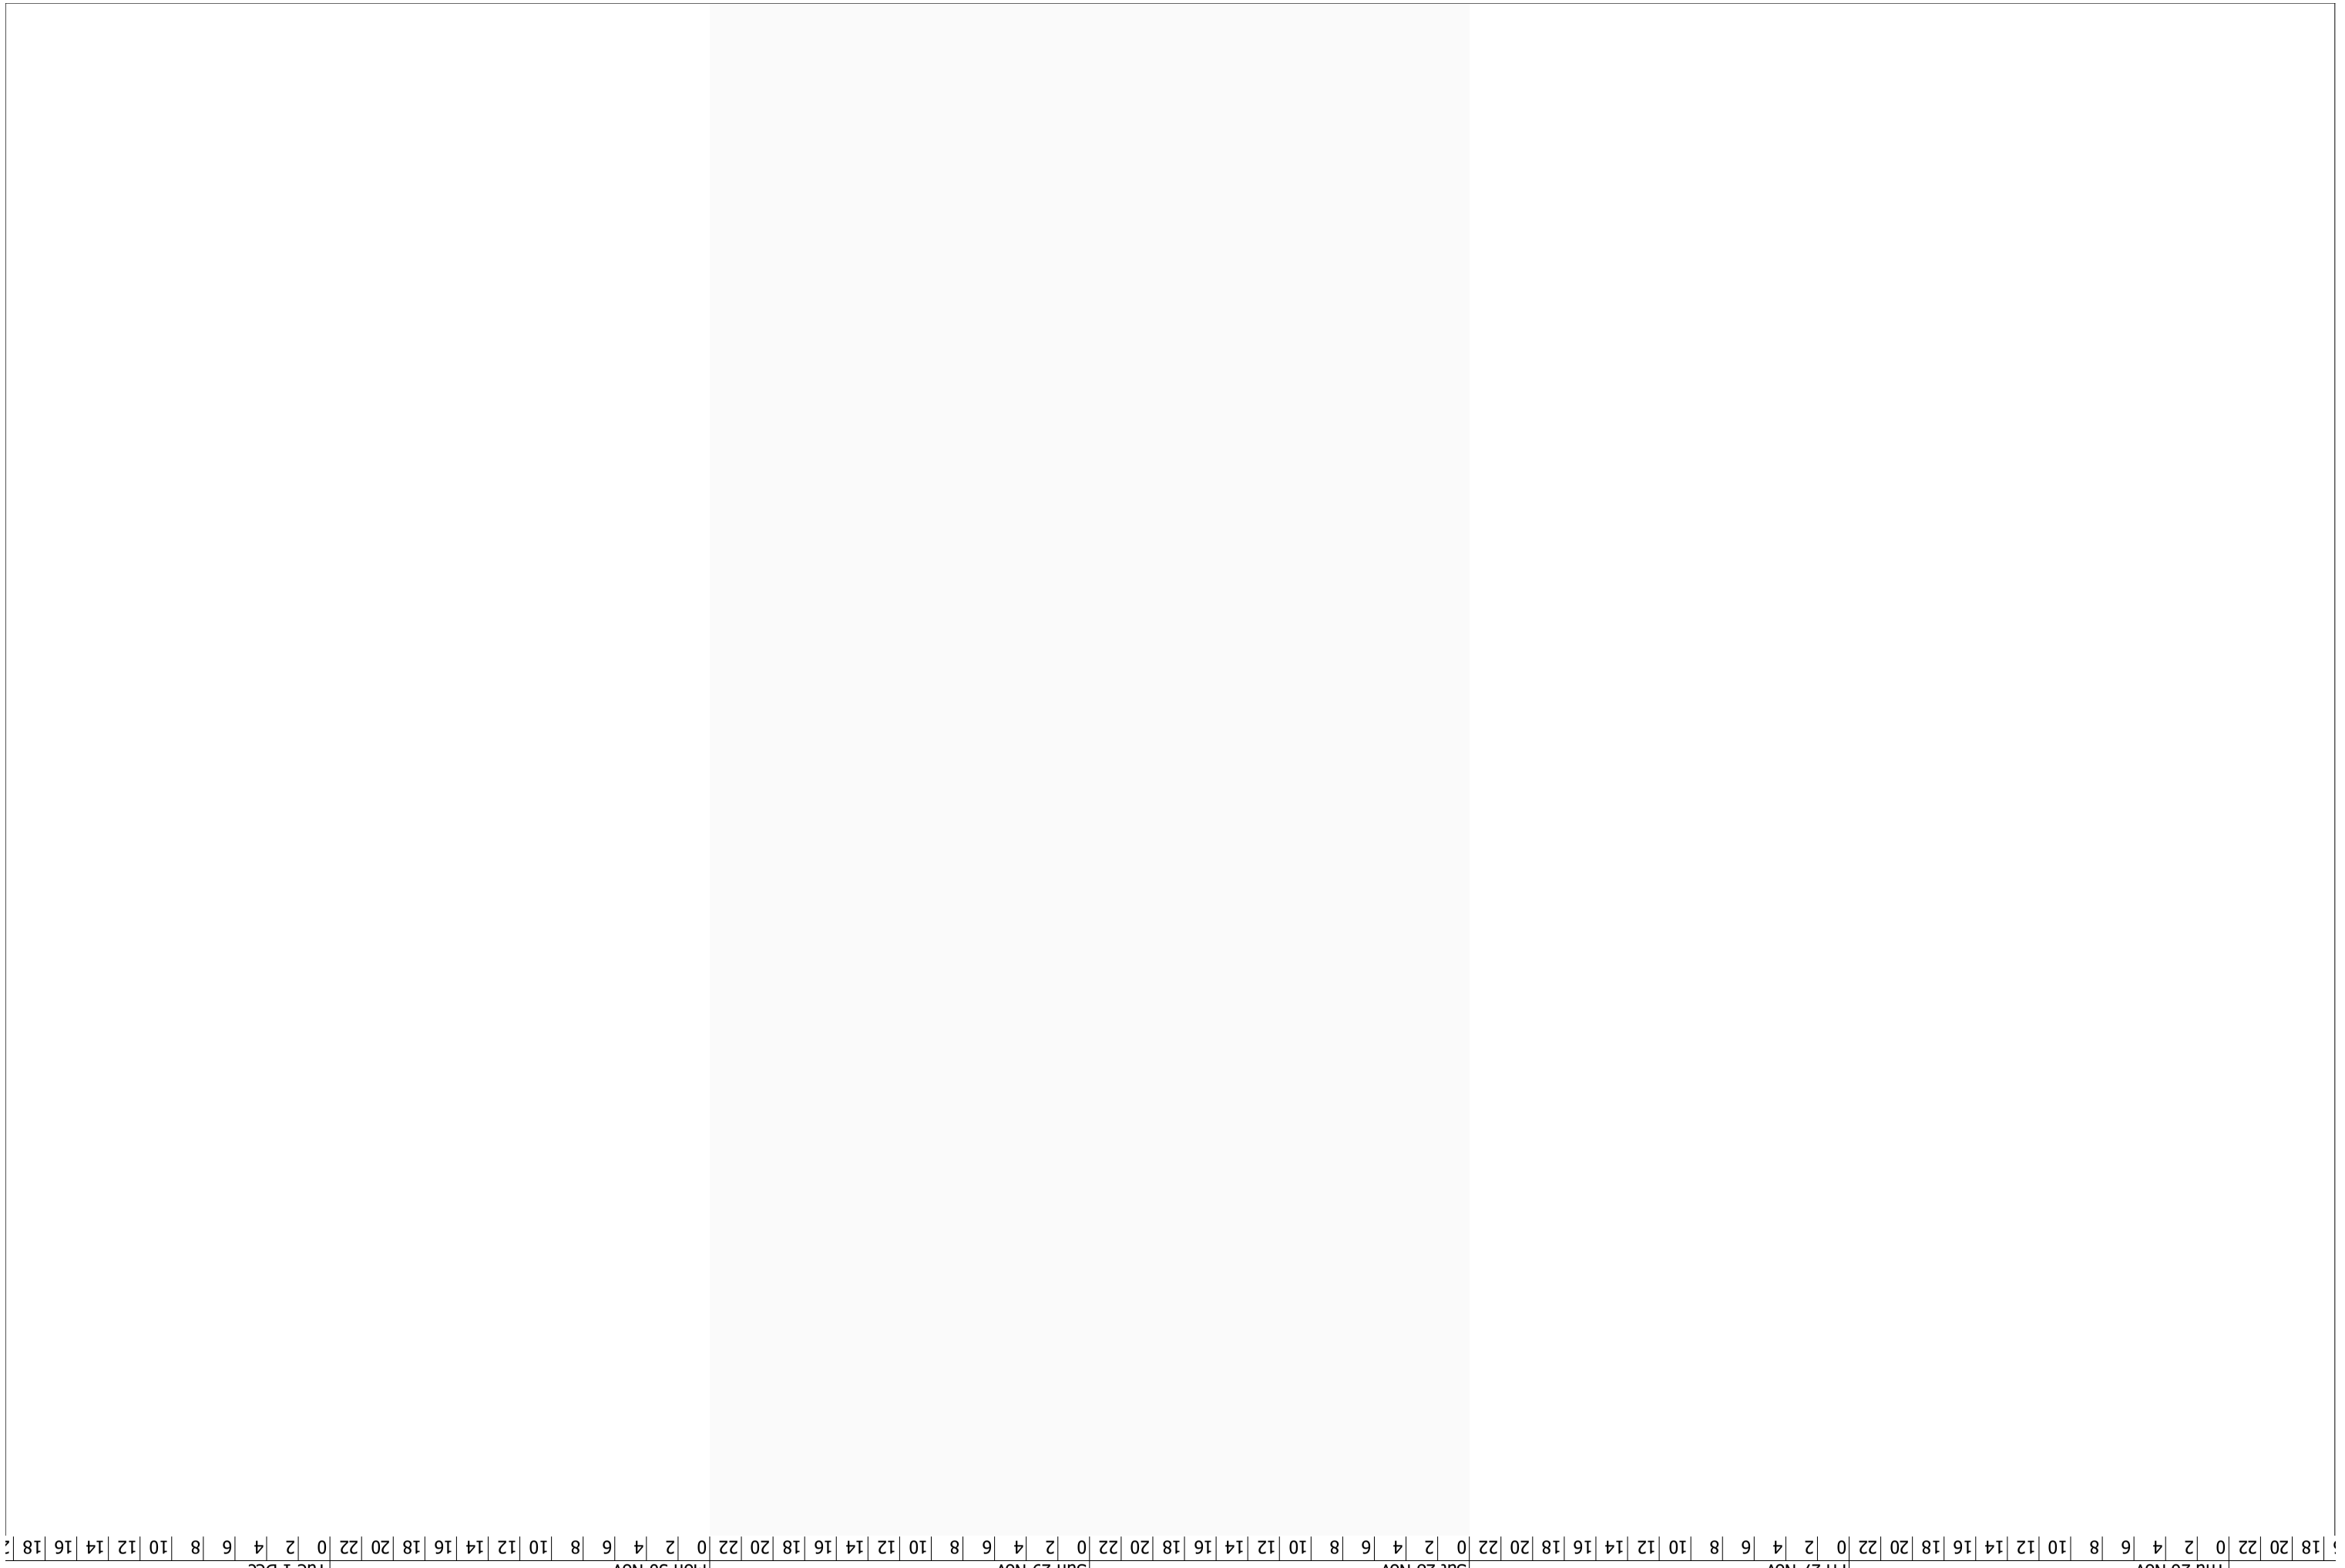


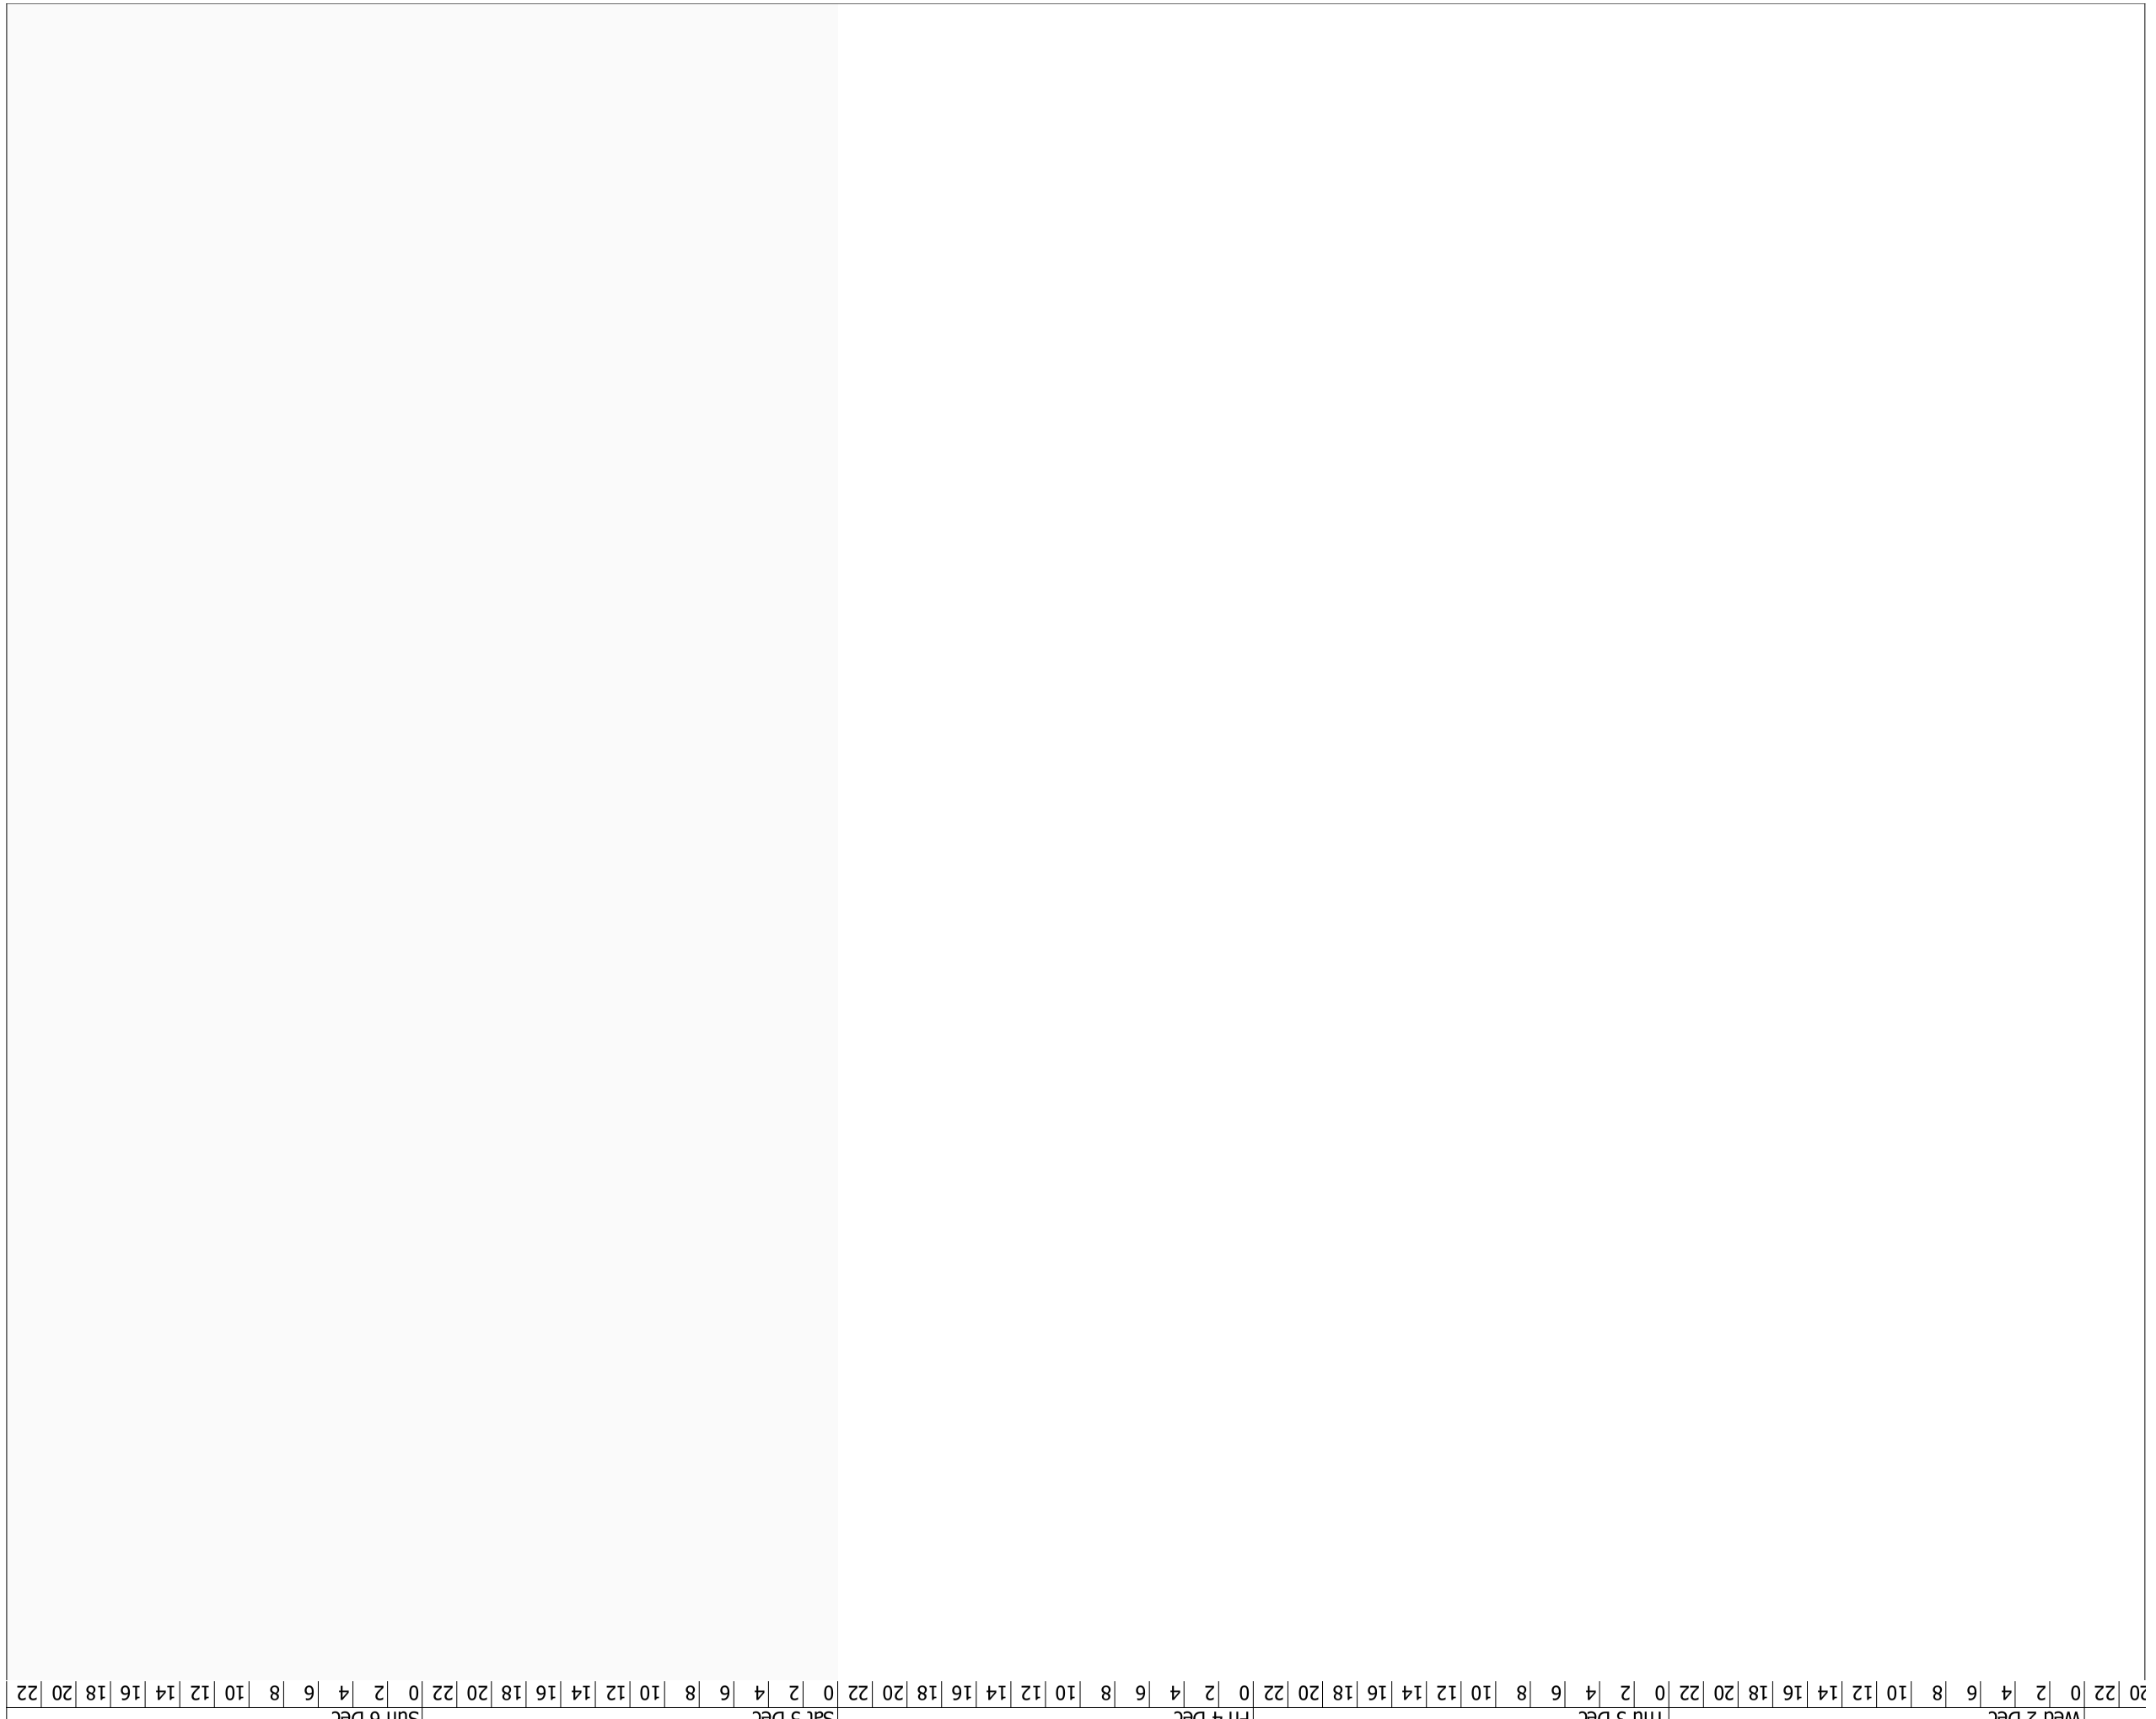

Mon 2 Nov
Tue 3 Nov
Wed 4 Nov
Thu 5 Nov
Fri 6 Nov
Sat 7 Nov
11/4
ark97;mrs236
sh3339
11/3
css67;laaa22
kla37
11/2
ark97;css67;kla37;laaa22;mrs236;sh3339

Sun 8 Nov
8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Mon 9 Nov
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Tue 10 Nov
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Wed 11 Nov
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Thu 12 Nov
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Fri 13 Nov
0 2 4 6 8 1

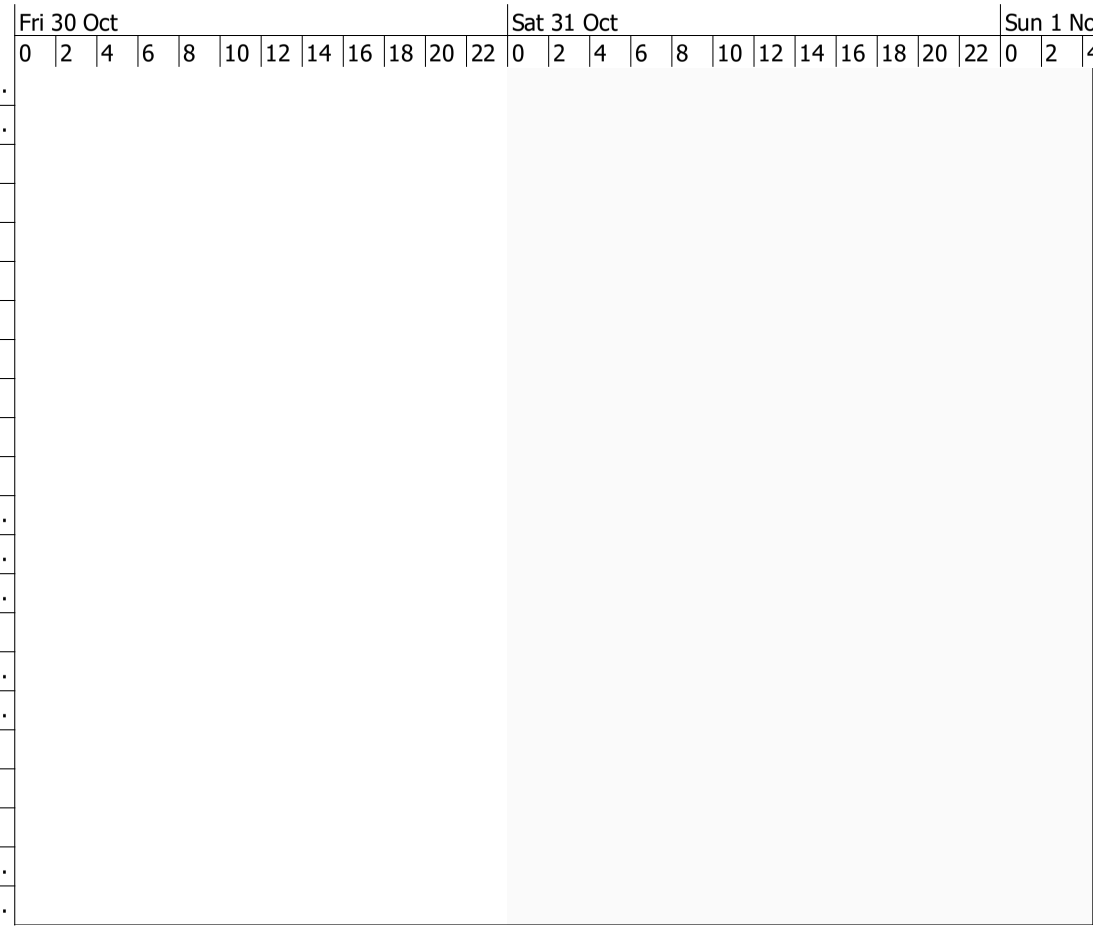

Sat 14 Nov
0 12 14 16 18 20 22
Sun 15 Nov
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Mon 16 Nov
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Tue 17 Nov
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Wed 18 Nov
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Thu 19 Nov
0 2 4 6 8 10 12

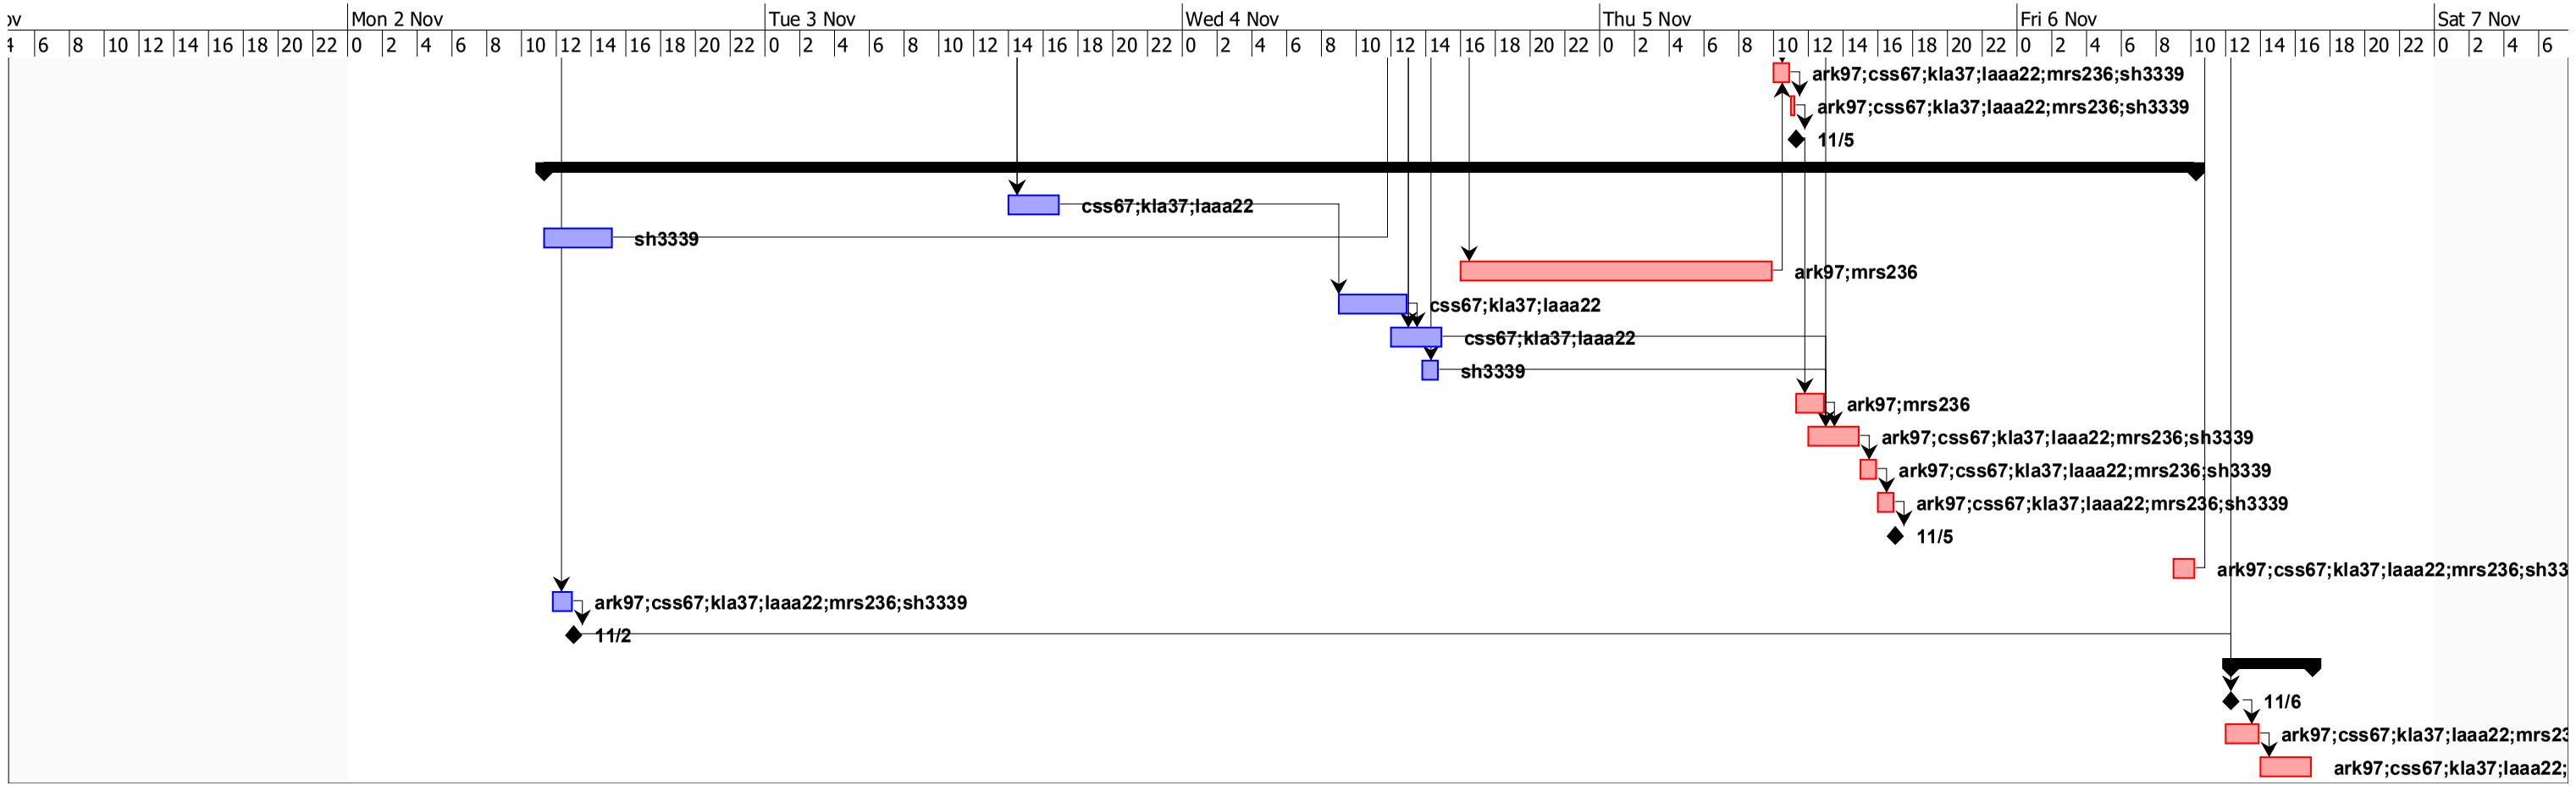

Fri 20 Nov
14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Sat 21 Nov
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Sun 22 Nov
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Mon 23 Nov
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Tue 24 Nov
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Wed 25 Nov
0 2 4 6 8 10 12 14 16

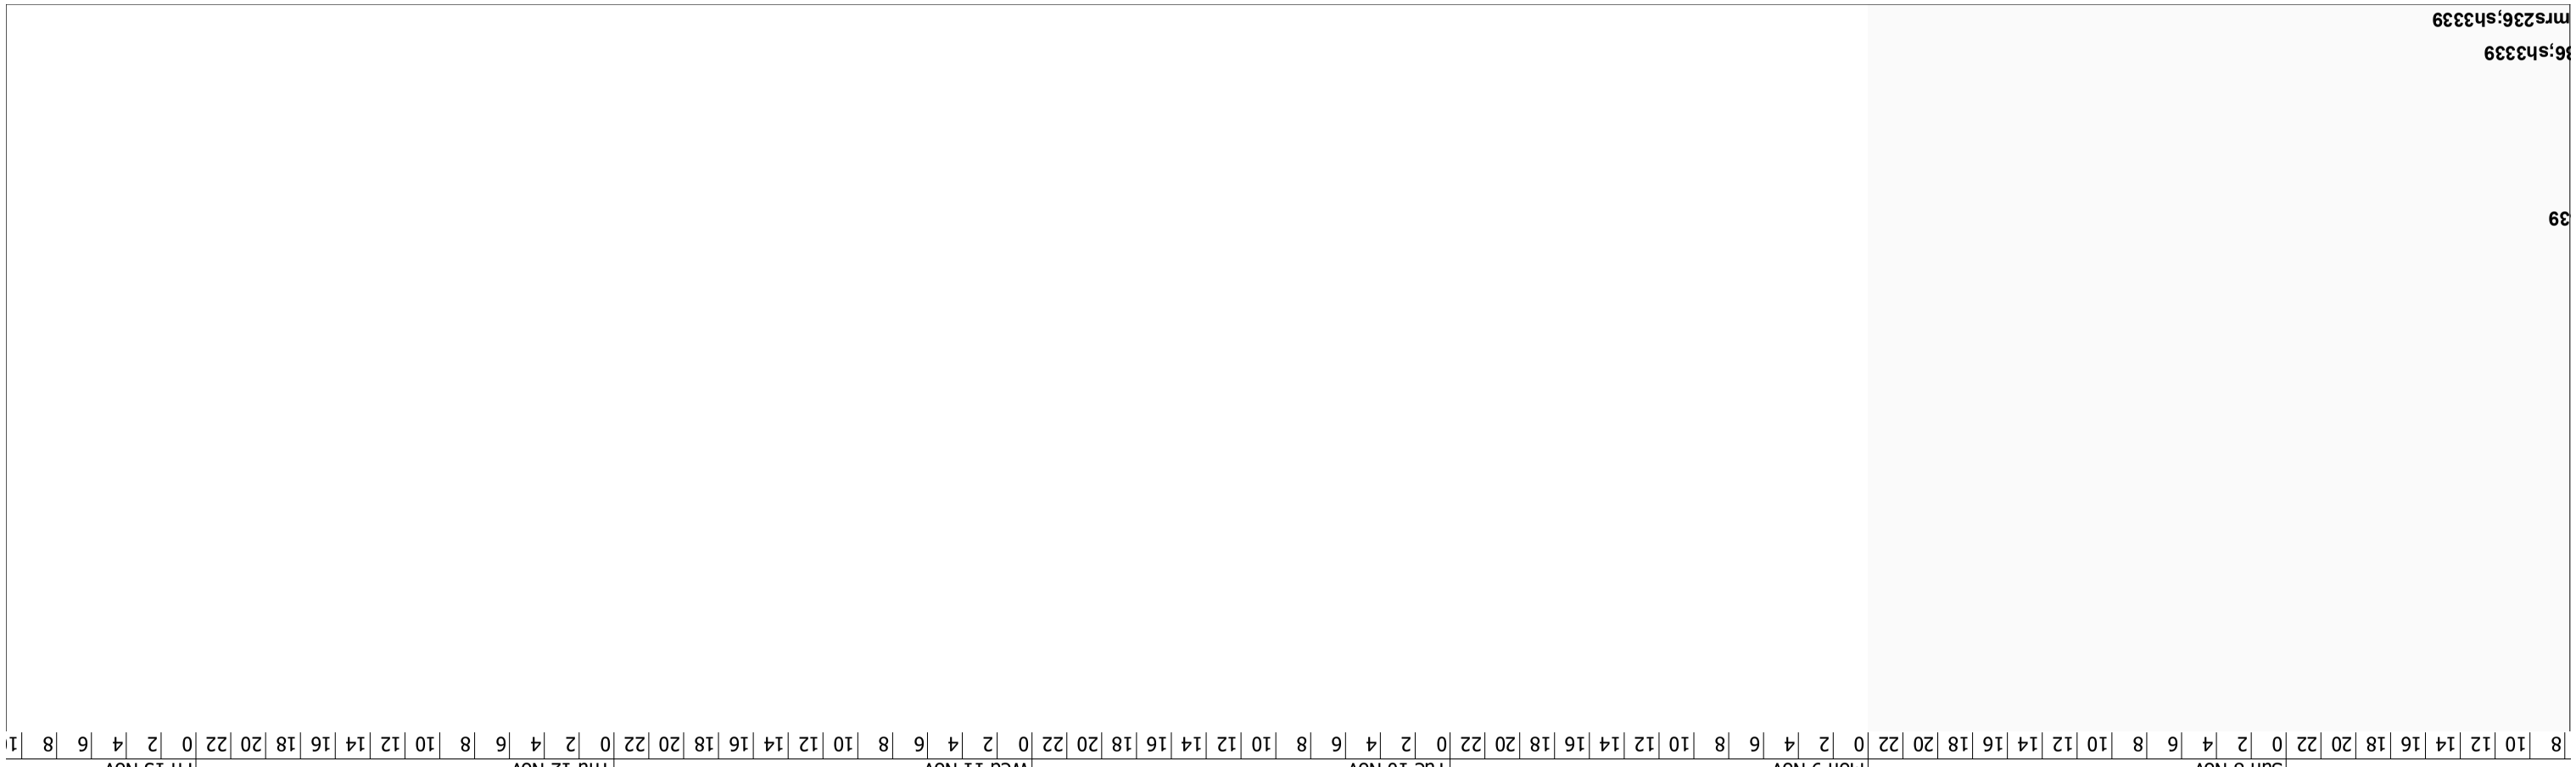

Thu 26 Nov
Fri 27 Nov
Sat 28 Nov
Sun 29 Nov
Mon 30 Nov
Tue 1 Dec
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

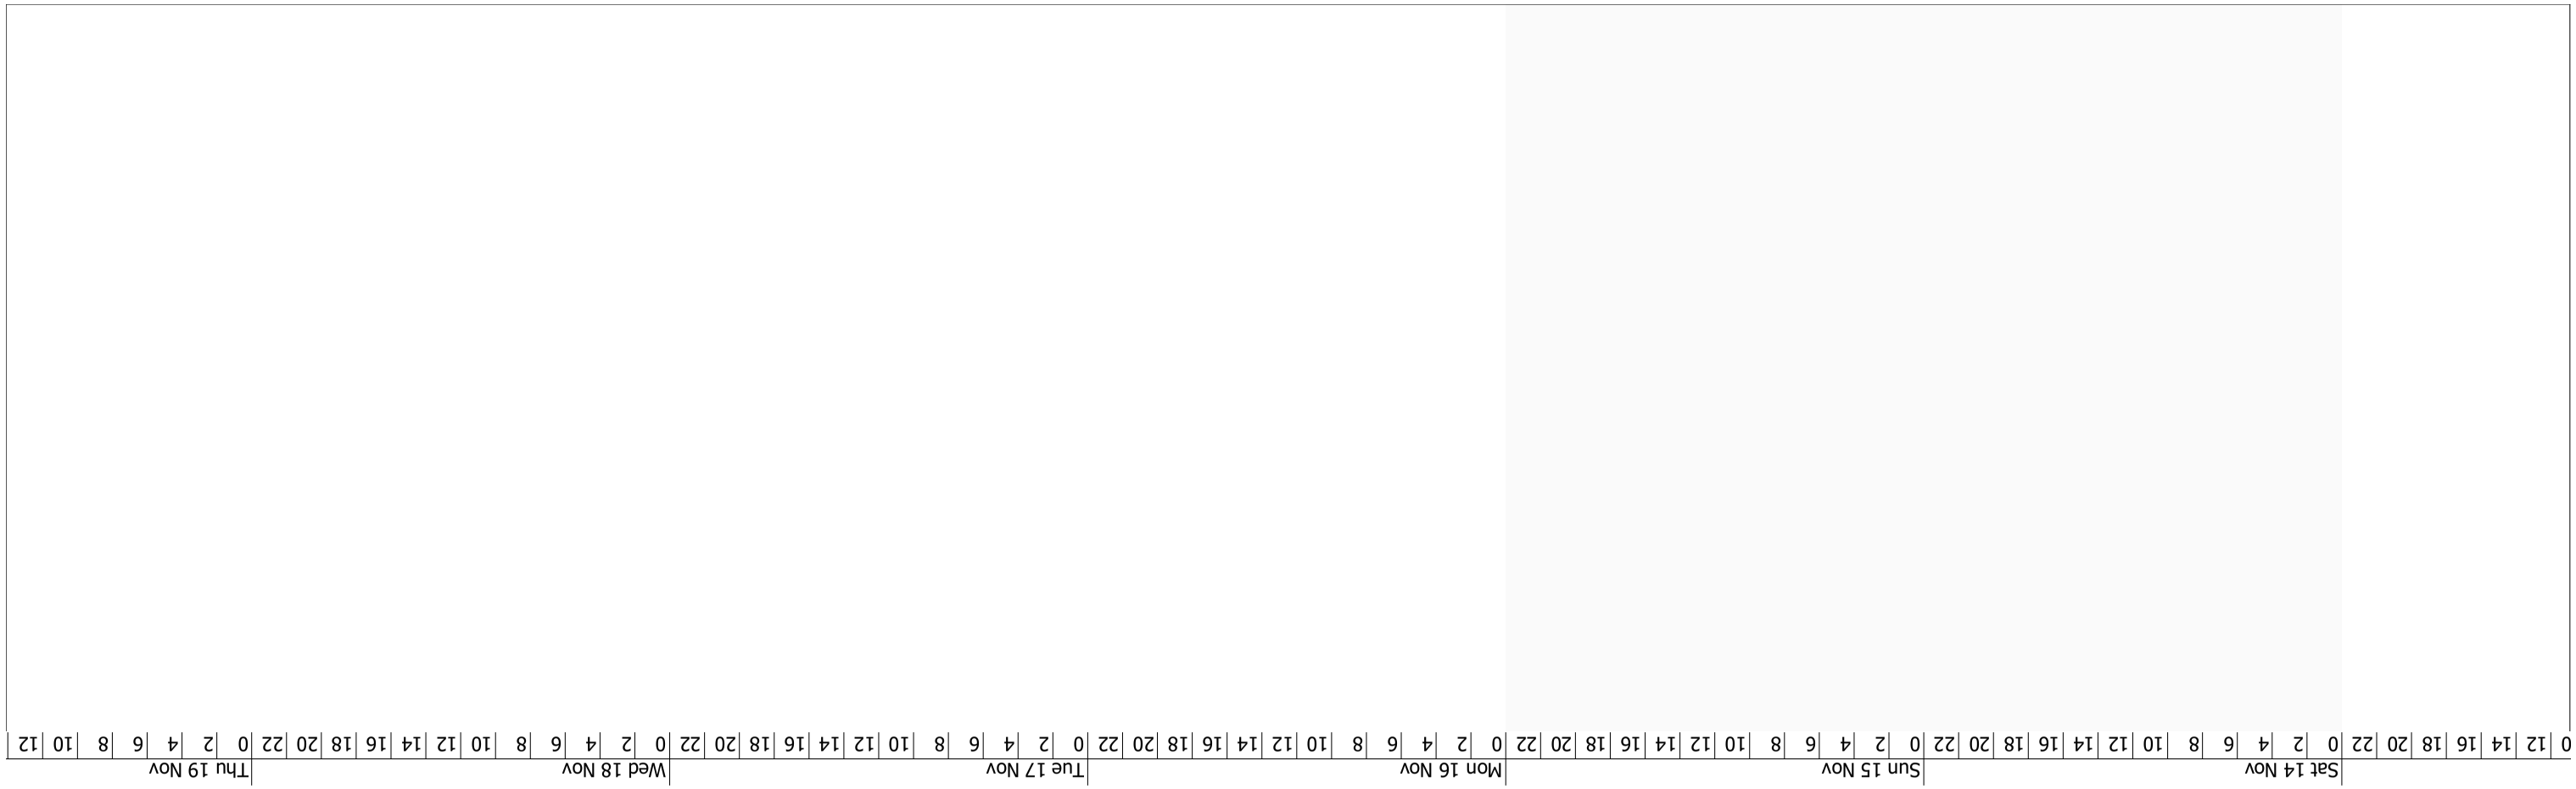

Wed 2 Dec
20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Thu 3 Dec
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Fri 4 Dec
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Sat 5 Dec
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Sun 6 Dec
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

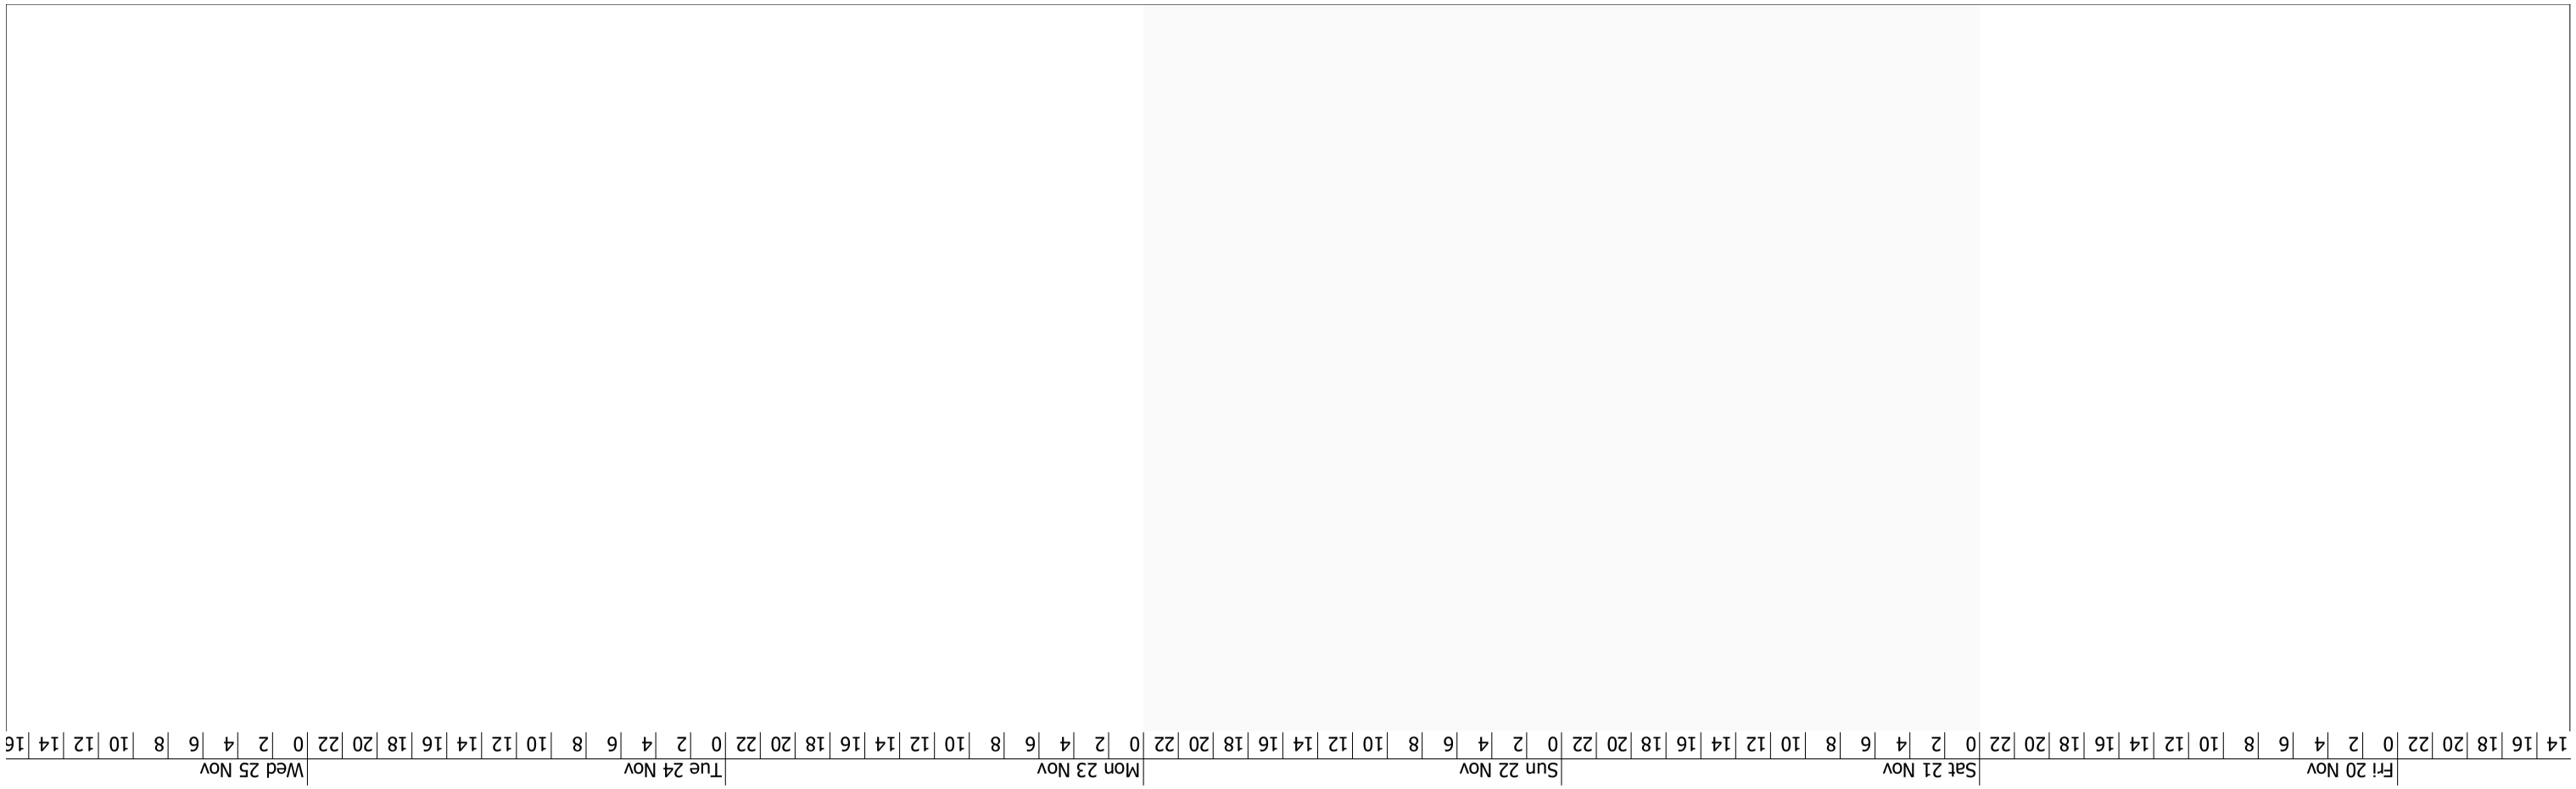
		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
52		Mock audit (30-second r...	0.125 days	11/5/26, 10:00 AM	11/5/26, 11:00 AM	51;58	ark97;css67;kla37;laaa22;m...
53		Buffer: before audit	0.031 days	11/5/26, 11:00 AM	11/5/26, 11:15 AM	52	ark97;css67;kla37;laaa22;m...
54		Audit	0 days	11/5/26, 11:15 AM	11/5/26, 11:15 AM	53	
55		**WP7 Individual slidesh...**	**3.375 days**	**11/2/26, 11:15 AM**	**11/6/26, 10:15 AM**		
56		Individual research for p...	0.375 days	11/3/26, 2:00 PM	11/3/26, 5:00 PM	16;17	css67;kla37;laaa22
57		Individual research for p...	0.375 days	11/2/26, 11:15 AM	11/2/26, 3:15 PM		sh3339
58		Individual research for p...	0.25 days	11/4/26, 4:00 PM	11/5/26, 10:00 AM	40	ark97;mrs236
59		Slide visuals: diagram, im...	0.375 days	11/4/26, 9:00 AM	11/4/26, 1:00 PM	56	css67;kla37;laaa22
60		Add measured graphs a...	0.25 days	11/4/26, 1:00 PM	11/4/26, 3:00 PM	59;27;35	css67;kla37;laaa22
61		Slide visuals: diagram, im...	0.125 days	11/4/26, 1:45 PM	11/4/26, 2:45 PM	50	sh3339
62		Slide visuals: diagram, im...	0.094 days	11/5/26, 11:15 AM	11/5/26, 1:00 PM	54	ark97;mrs236
63		Individual slideshows an...	0.25 days	11/5/26, 1:00 PM	11/5/26, 3:00 PM	60;61;62;18	ark97;css67;kla37;laaa22;m...
64		Record and edit individu...	0.125 days	11/5/26, 3:00 PM	11/5/26, 4:00 PM	63	ark97;css67;kla37;laaa22;m...
65		Buffer: re-recording and...	0.125 days	11/5/26, 4:00 PM	11/5/26, 5:00 PM	64	ark97;css67;kla37;laaa22;m...
66		Videossubmitted	0 days	11/5/26, 5:00 PM	11/5/26, 5:00 PM	65	
67		Rehearse and finalise in...	0.156 days	11/6/26, 9:00 AM	11/6/26, 10:15 AM		ark97;css67;kla37;laaa22;m...
68		Add full adder result to i...	0.031 days	11/2/26, 11:45 AM	11/2/26, 1:00 PM	42	ark97;css67;kla37;laaa22;m...
69		Slideshowscomplete	0 days	11/2/26, 1:00 PM	11/2/26, 1:00 PM	68	
70		**WP8 Close-out**	**0.5 days**	**11/6/26, 12:15 PM**	**11/6/26, 5:00 PM**		
71		Kit return	0 days	11/6/26, 12:15 PM	11/6/26, 1:00 PM	42;69	
72		Wrap-up and team refle...	0.125 days	11/6/26, 1:00 PM	11/6/26, 2:00 PM	71	ark97;css67;kla37;laaa22;m...
73		Individual Mahara write-...	0.375 days	11/6/26, 2:00 PM	11/6/26, 5:00 PM	72	ark97;css67;kla37;laaa22;m...

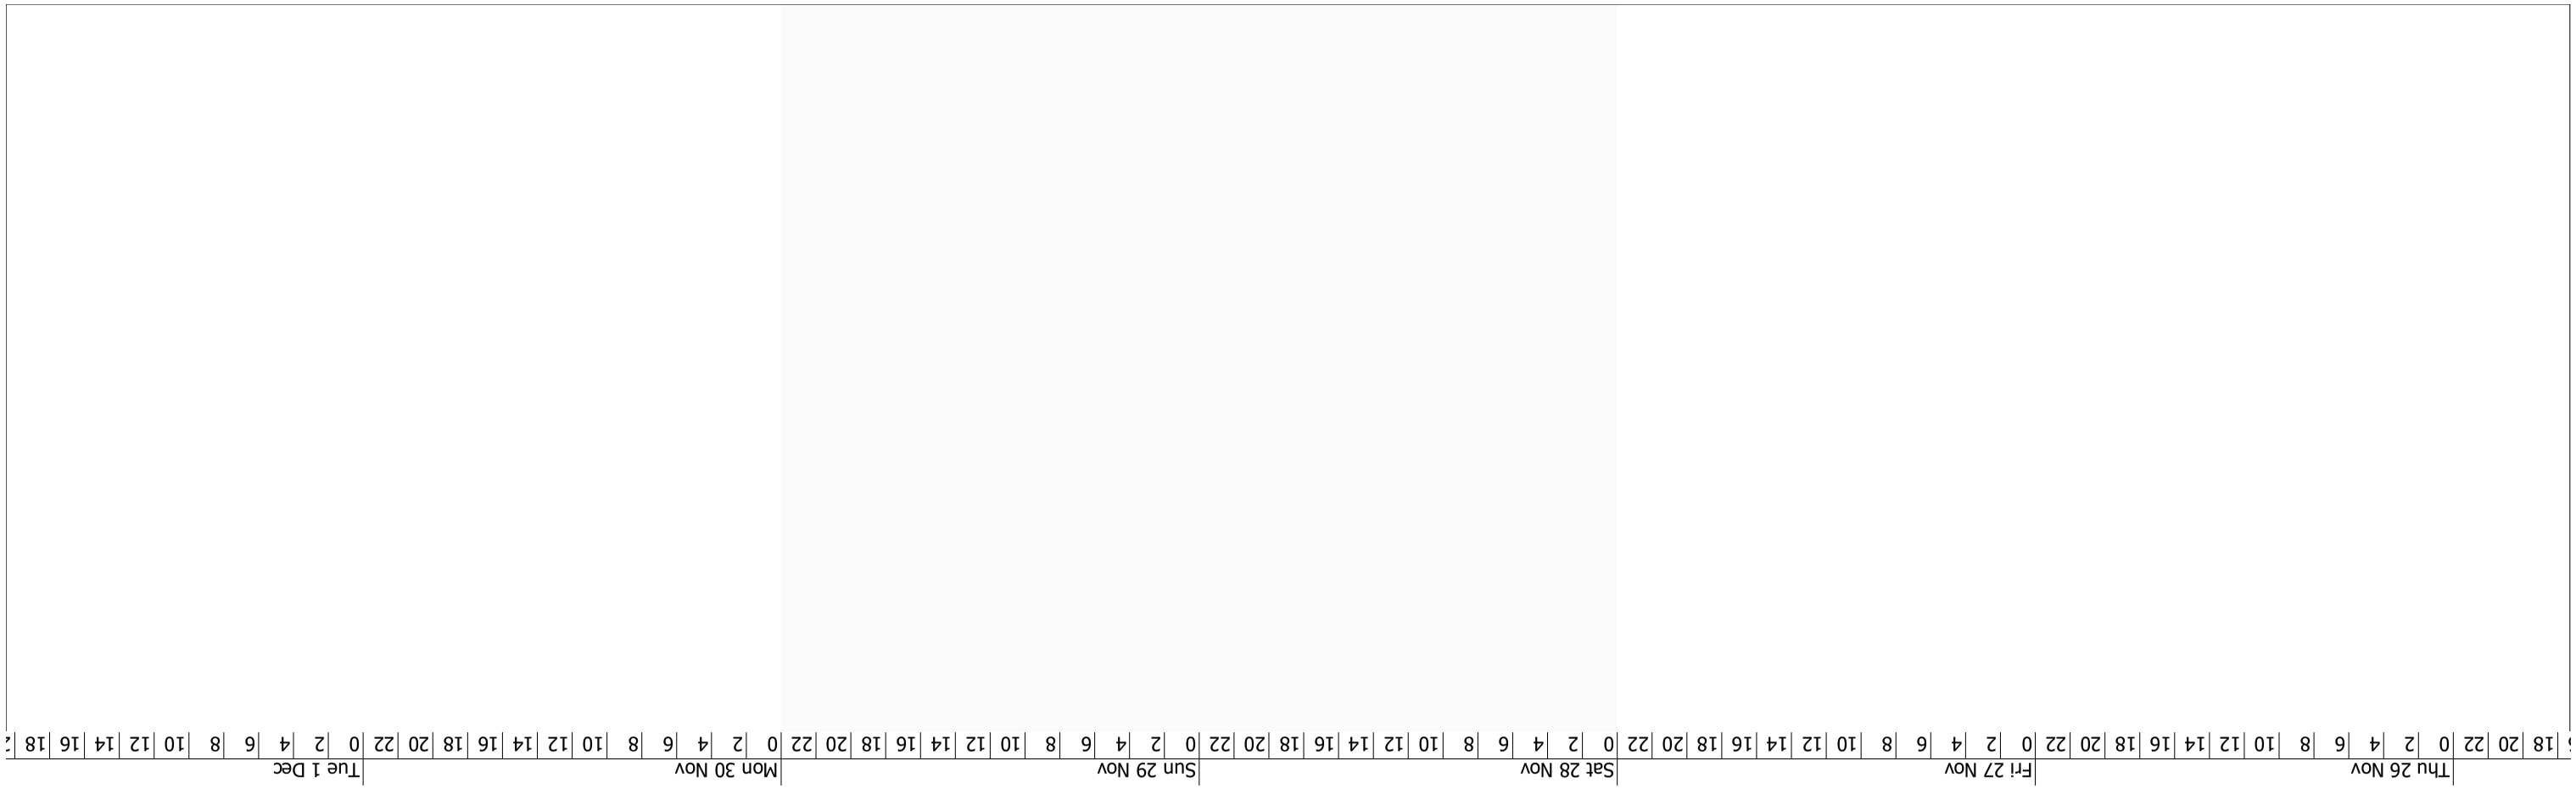


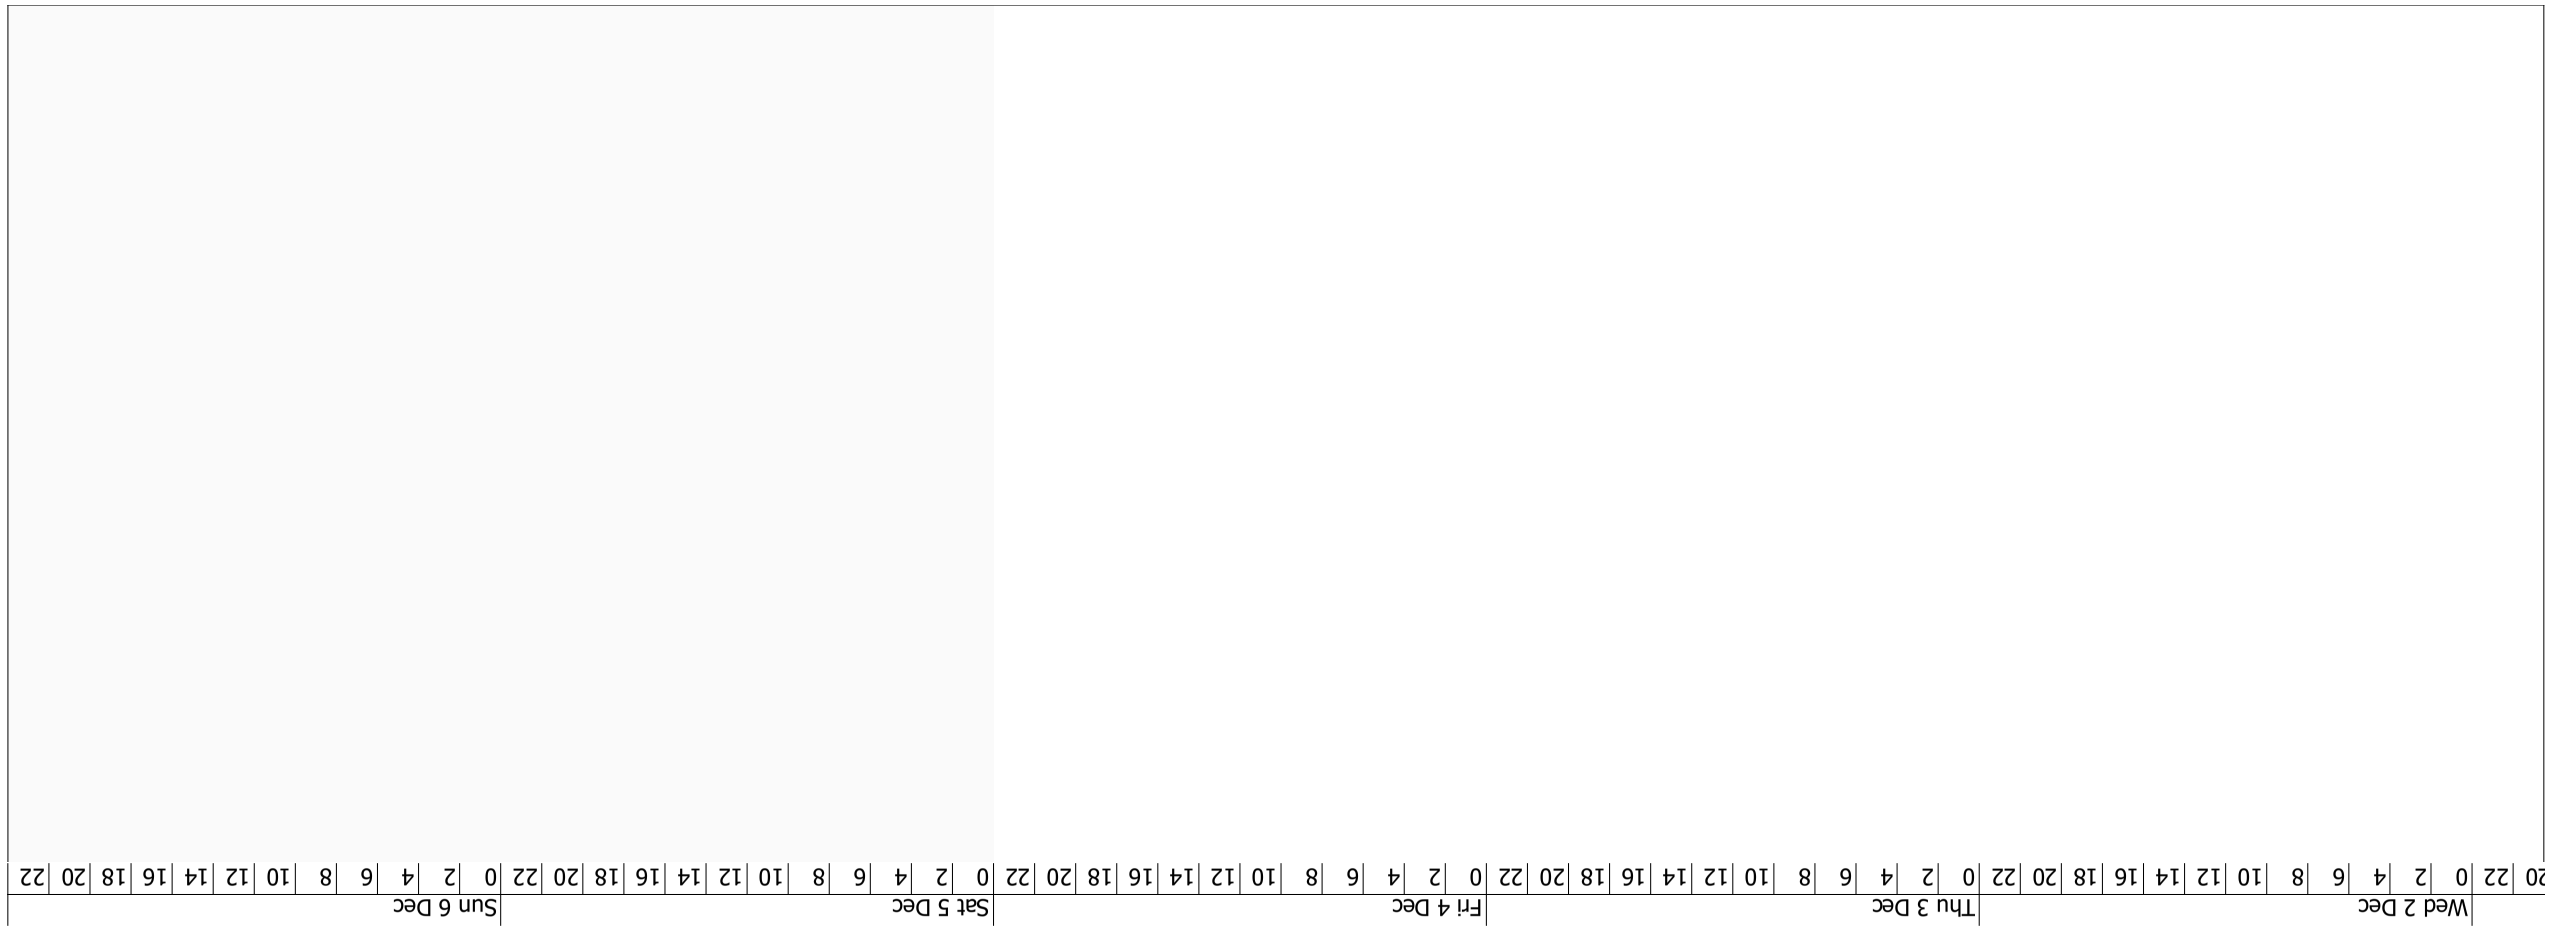

Mon 2 Nov
Tue 3 Nov
Wed 4 Nov
Thu 5 Nov
Fri 6 Nov
Sat 7 Nov
ark97;css67;kla37;laaa22;mrs236;sh3339
ark97;css67;kla37;laaa22;mrs236;sh3339
11/5
css67;kla37;laaa22
sh3339
ark97;mrs236
css67;kla37;laaa22
css67;kla37;laaa22
sh3339
ark97;mrs236
ark97;css67;kla37;laaa22;mrs236;sh3339
ark97;css67;kla37;laaa22;mrs236;sh3339
ark97;css67;kla37;laaa22;mrs236;sh3339
11/5
ark97;css67;kla37;laaa22;mrs236;sh33
ark97;css67;kla37;laaa22;mrs236;sh3339
11/2
11/6
ark97;css67;kla37;laaa22;mrs23
ark97;css67;kla37;laaa22;


Sun 8 Nov
Mon 9 Nov
Tue 10 Nov
Wed 11 Nov
Thu 12 Nov
Fri 13 Nov
8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 1
39
36;sh3339
mrs236;sh3339


Sat 14 Nov
Sun 15 Nov
Mon 16 Nov
Tue 17 Nov
Wed 18 Nov
Thu 19 Nov
0 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12


Fri 20 Nov
14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Sat 21 Nov
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Sun 22 Nov
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Mon 23 Nov
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Tue 24 Nov
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Wed 25 Nov
0 2 4 6 8 10 12 14 16


Thu 26 Nov
Fri 27 Nov
Sat 28 Nov
Sun 29 Nov
Mon 30 Nov
Tue 1 Dec


Wed 2 Dec
Thu 3 Dec
Fri 4 Dec
Sat 5 Dec
Sun 6 Dec
20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
